

Commune : **INDEFINI**Rivière : **Le Maroni****Village Langa Tabiki #3 - logement de l'état****1**

Repère(s) sur le site

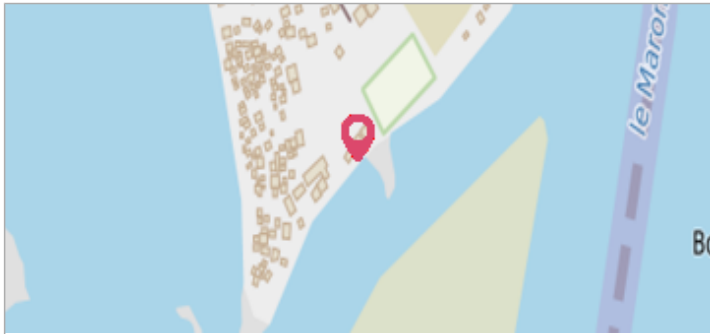
GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY_BRL12_S_12

Date de mise à jour : 08/01/2018

Auteur : DEAL Guyane

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.44045800 / Y: 4.99074553

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 118377.48 / Y: 552638.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.440458 / Y: 4.9907455

Code Hydro: 5---0000

Rive de référence: Droite

**Mai 2006**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Mur à l'extérieur de la maison

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL12_R_12_1

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL Guyane

19/02/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2011

Méthode : Non renseigné

Organisme : BRL Ingénierie

Commentaires sur le nivellement : Mesure manuelle avec un mètre.

La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : dalle béton

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.680 m
